



Baufortschrittsbericht

Rudolf-Steiner-Schule Siegen

Aufstockung Turnhalle und Anbau

Fotodokumentation | 29. Juli bis 10. September 2026

Der Bericht fasst 17 ausgewählte Aufnahmen zusammen. Sie zeigen die Montage des Holzbaus, den zunehmend geschlossenen Rohbau, die vorbereitete Bodenplatte des Anbaus und den anschließenden Beginn des Innenausbaus.

Dokumentierter Stand

Innerhalb des dokumentierten Zeitraums ist ein klarer Baufortschritt sichtbar. Ende Juli wurden wesentliche Holzrahmen- und Tragelemente der Aufstockung montiert. Bis Ende August war die Gebäudehülle deutlich weiter geschlossen. Anfang September folgten Metallständerwände, erste Beplankungen und Installationsvorbereitungen im Innenraum.

29.07.2026 Aufstellen und Einheben großformatiger Holzbauelemente

30.-31.07.2026 Ausbildung der Tragstruktur und räumliche Fassung der Aufstockung

19.-20.08.2026 Fortschritt an Innenraum und Außenwandflächen

25.08.2026 Vorbereitete Bodenplatte für den Anbau

07.-10.09.2026 Innenausbau und ergänzende Arbeiten an der Gebäudehülle

Einordnung

Die Bildauswahl ist eine visuelle Dokumentation und ersetzt keine fachtechnische Abnahme oder Prüfung. Beschrieben werden ausschließlich die erkennbaren Arbeiten und Bauzustände.



29.07.2026

Montage vorgefertigter Holzbauelemente

Ein großformatiges Wandelement wird mit dem Kran an seine vorgesehene Position gehoben.



29.07.2026

Fortschritt der umlaufenden Holzkonstruktion

Bereits am selben Tag ist die räumliche Fassung der Aufstockung deutlich weiter fortgeschritten.



30.07.2026

Anlieferung und Montage weiterer Elemente

Die Außenaufnahme zeigt bereitgestellte beziehungsweise neu positionierte Holzrahmenelemente.



30.07.2026

Tragkonstruktion über der Halle

Die großformatigen Holzträger überspannen den Innenraum und prägen die neue Gebäudestruktur.



31.07.2026

Rohbau der Aufstockung im Innenraum

Wände, Öffnungen und Tragstruktur sind im Zusammenhang erkennbar; Schutznetze sichern die Arbeiten.



19.08.2026

Weiterentwicklung des Innenausbaus

Die Gebäudehülle ist weiter geschlossen; im Innenraum liegen Materialien für die nächsten Arbeitsschritte bereit.



20.08.2026

Arbeiten an der Außenwand

An der beplankten Holzrahmenwand werden weitere Montage- und Anschlussarbeiten ausgeführt.



20.08.2026

Geschlossener Rohbau im Außenbereich

Die Außenwandflächen sind weitgehend beplankt; Fenster- und Anschlussbereiche bleiben für den weiteren Ausbau vorbereitet.



25.08.2026

Vorbereitete Fläche des Anbaus

Die Bodenplatte und die randseitigen Anschlüsse bilden die Grundlage für die folgenden Rohbauarbeiten am Anbau.



07.09.2026

Flurbereich mit Metallständerwänden

Die neuen Raumgrenzen sind durch Metallprofile ablesbar; Material für die weitere Beplankung liegt bereit.



07.09.2026

Ausbaufäche mit Fenstern und Trennwänden


Fensterelemente, Holztragwerk und neu gestellte Metallprofile zeigen die beginnende Gliederung der Innenräume.



07.09.2026

Ausgebildete Raumstruktur

Teilweise beplankte Wände und vorbereitete Öffnungen machen die spätere Raumaufteilung deutlich sichtbar.

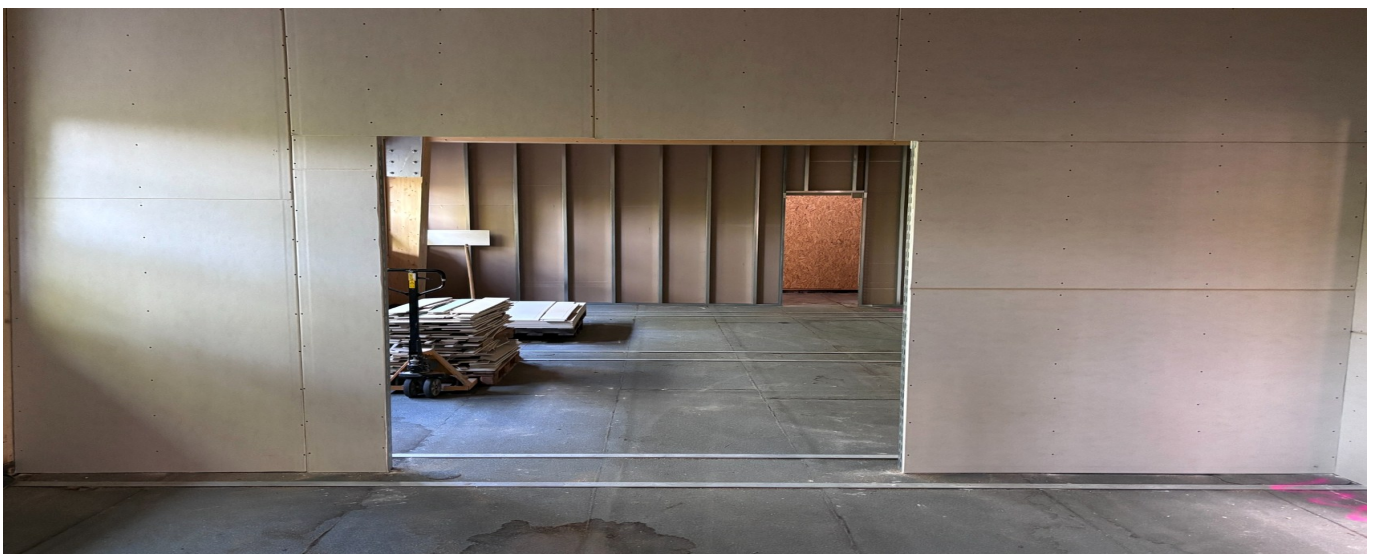

07.09.2026

Beplankte Innenwand mit Türöffnung

Eine Trennwand ist bereits großflächig beplankt; die Türöffnung verbindet die angrenzenden Ausbaufächen.



07.09.2026

Vorbereiteter Sanitärbereich

Installationsrahmen und Vorwandkonstruktion sind eingebaut; die Flächen bleiben für den weiteren Ausbau zugänglich.



07.09.2026

Fortschritt in einem schmalen Nebenraum

Eine Wandseite ist bereits beplankt, während die gegenüberliegende Konstruktion den weiteren Schichtaufbau erkennen lässt.



10.09.2026

Ergänzender Stand der Außenfassade

Die montierte Außenbekleidung dokumentiert den parallel zum Innenausbau fortschreitenden Abschluss der Gebäudehülle.

Zusammenfassung des Baufortschritts

Die Aufstockung hat sich vom offenen Montagezustand zu einem weitgehend geschlossenen Holzrohbau entwickelt. Anfang September ist der Übergang zum Innenausbau klar erkennbar: Raumstrukturen werden hergestellt, Wände teilweise beplankt und Installationsbereiche vorbereitet. Am Anbau ist die Bodenplatte ausgeführt.
